


N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	07/01/2017	08/01/2017	1
2	B	Allestimento cantiere	08/01/2017	13/01/2017	5
3	C.1	Scavi e demolizioni varie	13/01/2017	02/02/2017	20
4	C.2	Realizzazione muri	30/01/2017	01/03/2017	30
5	C.3	Realizzazione sottoservizi (elettrico, idrico, fognario etc...)	20/02/2017	22/03/2017	30
6	C.4	Preparazione piano di posa dei rilevati e compattazione	01/03/2017	16/03/2017	15
7	C.5	Collegamento impianti	15/03/2017	14/04/2017	30
8	C.6	Pavimentazione stradale	05/04/2017	25/04/2017	20
8	C.7	Massetti e spianata di malta	05/04/2017	15/04/2017	10
10	C.8	Pavimentazioni e rivestimenti vari	20/04/2017	30/05/2017	40
11	C.9	Illuminazione esterna	30/05/2017	19/06/2017	20
12	C.10	Posa in opera ascensore	30/04/2017	30/05/2017	30
13	C.11	Opere di rifiniture varie e recinzioni	01/06/2017	16/06/2017	15
14	E	Sistemazione aree a verde e lotto	09/06/2017	29/06/2017	20
15	F	Pulizia area di cantiere e smobilizzo	29/06/2017	04/07/2017	5
16	G	Fine lavori	04/07/2017	06/07/2017	2

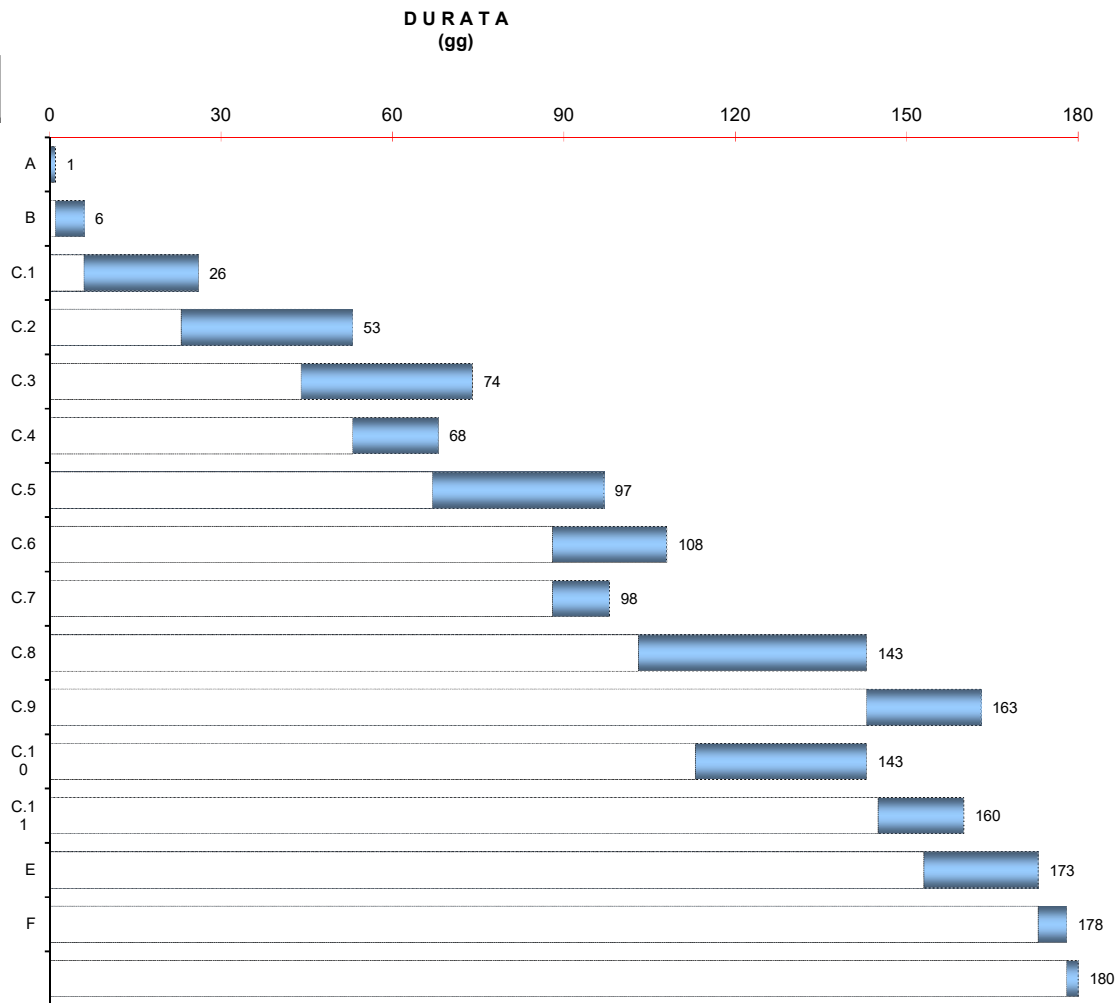

180

gg.

naturali consecutivi
